AUDYT TECHNICZNY I PLAN ROZWOJU

STRONA, KTÓRA NIE TYLKO WYGLĄDA.

ALE DZIAŁA.

Przegląd zmian Codexa, diagnostyka repozytorium oraz plan rozwoju funkcjonalnego MAD-NET — bez utraty wypracowanego charakteru wizualnego.



13
PAKIETÓW

03
TECHNOLOGIE

06
ETAPÓW ROZWOJU

01 / DIAGNOZA

Co naprawdę wymaga uwagi

Największym zagrożeniem nie jest design. To brak zielonego CI i niedziałająca produkcyjna ścieżka zapytania.

P0

STABILIZACJA

Naprawa regresji AIR przy 360 px, pełny CI i kontrola publikacji.

P1

UŻYTECZNOŚĆ

Mapa, mobilne menu, responsywność, spójny wybór pakietu.

P2

WZROST

SEO lokalne, treści usługowe i porównywanie ofert.

ZASADA PROWADZĄCA

ZACHOWAĆ CHARAKTER. USUNĄĆ BLOKERY. ROZWIJAĆ FUNKCJE.


Obecny HERO RACK i identyfikacja LAN / FIBER / AIR są atutem strony. Rozwój powinien być mierzalny, etapowy i oparty na testach.

02 / REPOZYTORIUM

Anatomia obecnego systemu

Audyt objął kod main, logi GitHub Actions, testy przeglądarkowe V20/V21, raporty PCB oraz historię poprawek Codexa.

ŁAŃCUCH MODUŁÓW / UPROSZCZONY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI

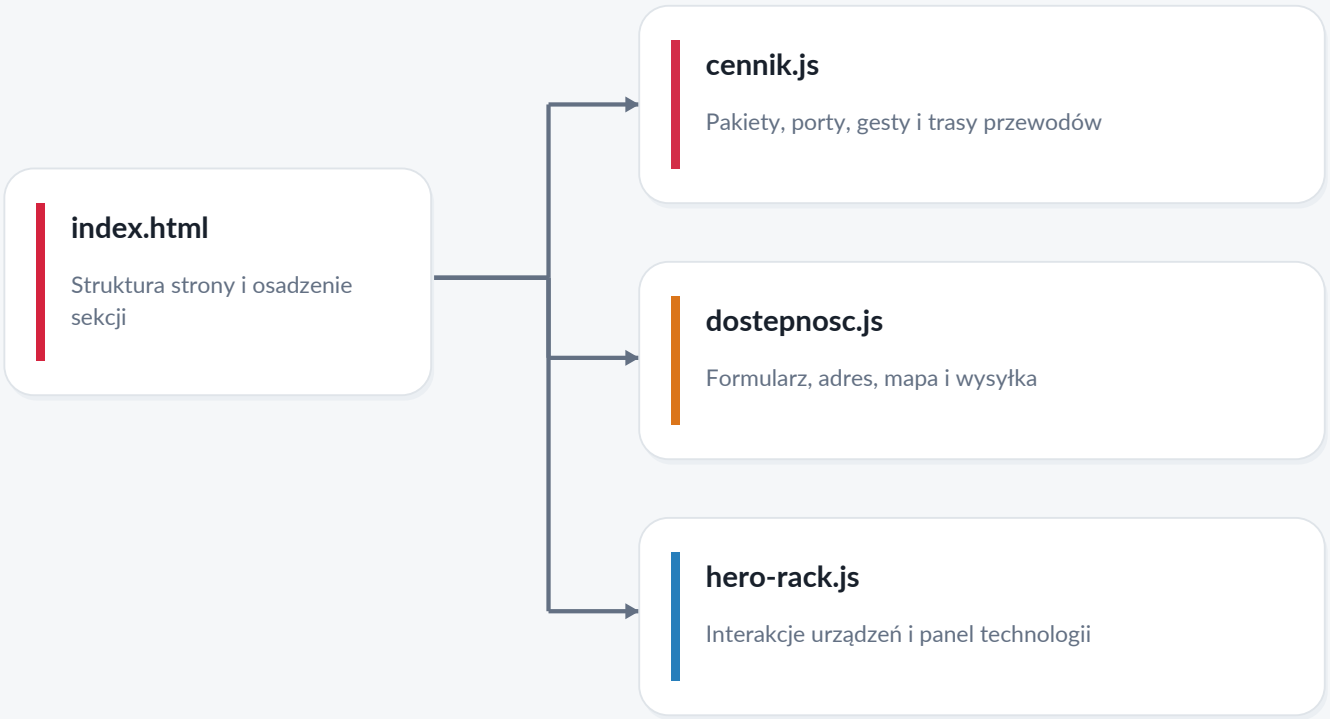

WARSTWA WSPÓŁDZIELONA

styles.css
Kaskada wyglądu

PLAN_DATA
Źródło danych pakietów

Testy V20/V21/PCB
Regresje i interakcje

ci.yml
Automatyzacja jakości

85
PLIKI I ZASOBY

36,2 MiB
ŁĄCZNY ROZMIAR

13
PAKIETY W DANYCH

03 / ZMIANY


Co rzeczywiście poprawił Codex

Potwierdzone commity zostały scalone do main. Wizualny charakter zmian jest korzystny, ale nie rozwiązuje blokera CI ani brakującego backendu.

CHRONOLOGIA ZMIAN / EVIDENCE-BASED

ca392bb	15c5d10	533005b	56e96d9	776b106	2c10706	f724536
Trwały hover	Kolor technologii	Ramka FIBER	Cień urządzeń	Etykiety umów	Strzałki +60%	Scalenie do mai

MECHANIZM / OPRAWA I STAN TECHNICZNY



PRZED
Konflikt stanu .is-active / :hover

PO
Trwały hover, barwa FIBER

04 / BLOKER P0

Regresja AIR: 360 pikseli

Ten sam test przeglądarkowy padał na kolejnych commitach. Jest to faktyczny, powtarzalny problem procesu kontroli jakości.

CI / FAIL

AssertionError

„Informacje i przycisk panelu nie mogą się zasłaniać: 360px AIR”

tests/v20.browser.mjs:182

W kodzie mobilny panel ma wysokość 274 px. Szczególnie długi opis AIR może kolidować z przyciskiem CTA.

SYMULACJA GEOMETRII / NIE SCREENSHOT




NAPRAWA: elastyczna wysokość + pomiary 360/390/768 px + test przed scaleniem.

05 / DELIVERY

CI jako bramka publikacji

Aktualnie GitHub Pages może zaktualizować stronę niezależnie od nieudanego workflow CI. Produkcja powinna działać inaczej.

OBECNIE / PROCESY NIEZALEŻNE

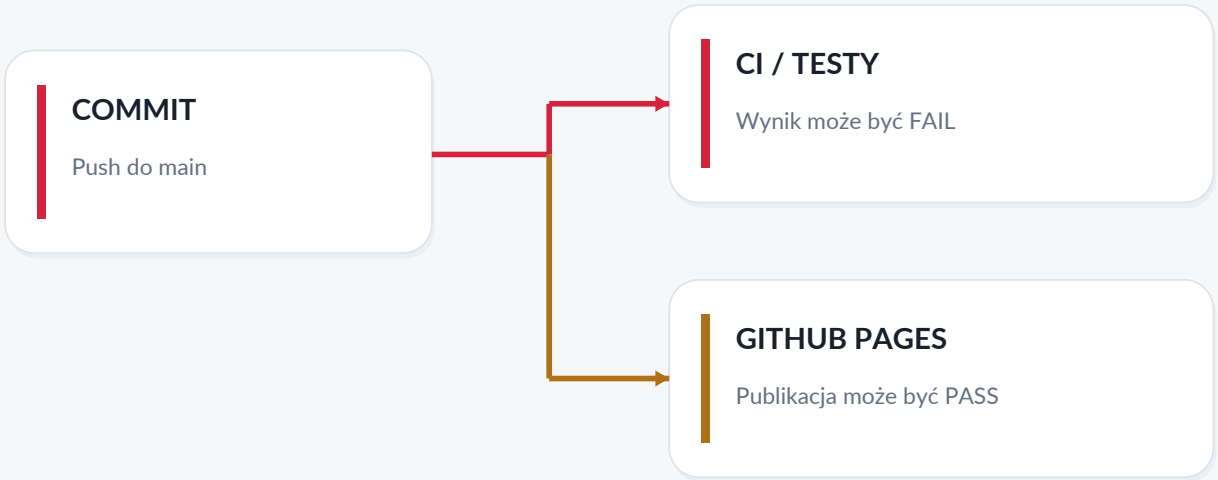

RYZYKO BIZNESOWE

Nowa wersja online

może zawierać błąd, który automatyczne testy już wykryły.

DOCELOWO / JEDNA SEKWENCJA Z GATE PASS



FAIL = STOP

06 / PRODUKT

HERO RACK 3.0: zachować jakość

Kierunek: nie wymieniać zatwierdzonej grafiki urządzeń. Wprowadzać tylko kontrolowane korekty interakcji i czytelności.



TRZY TECHNOLOGIE

LAN / RJ-45

5 pakietów i porty przewodowe

FIBER / SC/UPC

3 pakiety światłowodowe

AIR / RADIO

5 pakietów radiowych

PROTOTYP GRAFICZNY / NIE ORYGINALNA BITMAPA

Wymagane zachowania: trwały hover, właściwe kolory, touch bez scroll-lock, obsługa klawiatury.

07 / OFERTA

13 pakietów: dane z kodu

Miesięczny abonament dla umowy na 2 lata. Wartości pochodzą z PLAN_DATA, nie stanowią nowej propozycji cenowej.

FIBER

3 PAKIETÓW

50 Mbit	45 zł
100 Mbit	55 zł
300 Mbit	65 zł

LAN

5 PAKIETÓW

10 Mbit	49 zł
20 Mbit	59 zł
40 Mbit	64 zł
60 Mbit	69 zł
80 Mbit	74 zł

AIR

5 PAKIETÓW

10 Mbit	54 zł
20 Mbit	64 zł
40 Mbit	74 zł
60 Mbit	84 zł
80 Mbit	94 zł


FIBER: w danych brak ceny dla umowy na 1 rok. Nie dopisywać niepotwierdzonych kwot.

08 / INTERAKCJA

Przewody i gesty bez konfliktów

Przy połączeniach zachować ortogonalne trasy, łagodne narożniki i brak zasłaniania kart. Na telefonie rozdzielić trzy intencje.

PRZEBIEG LOGICZNY / PRZEWÓD OMIJA SĄSIEDNIE ELEMENTY

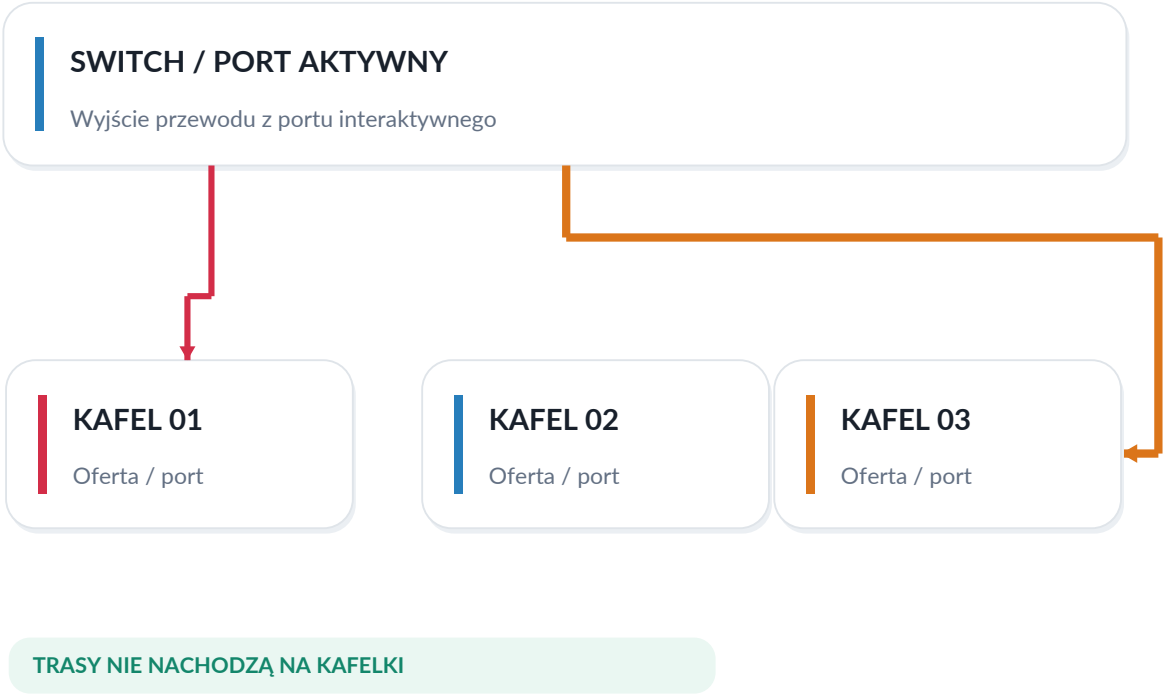

MODEL GESTÓW MOBILNYCH

TAP — **Wybór pakietu**

Świadome, krótkie dotknięcie.

HOLD 420 ms — **Podgląd czasowy**

Znów znika po puszczeniu.

SCROLL — **Przewijanie**


Żadnych kabli i hovera.

09 / KONWERSJA

Formularz bez backendu = martwy lead

Wersja testowa na GitHub Pages nie może przetworzyć PHP. Sam wygląd formularza nie wystarczy, jeżeli zapytanie nie dociera do operatora.

OBECNA ŚCIEŻKA / BRAK OBSŁUGI POST

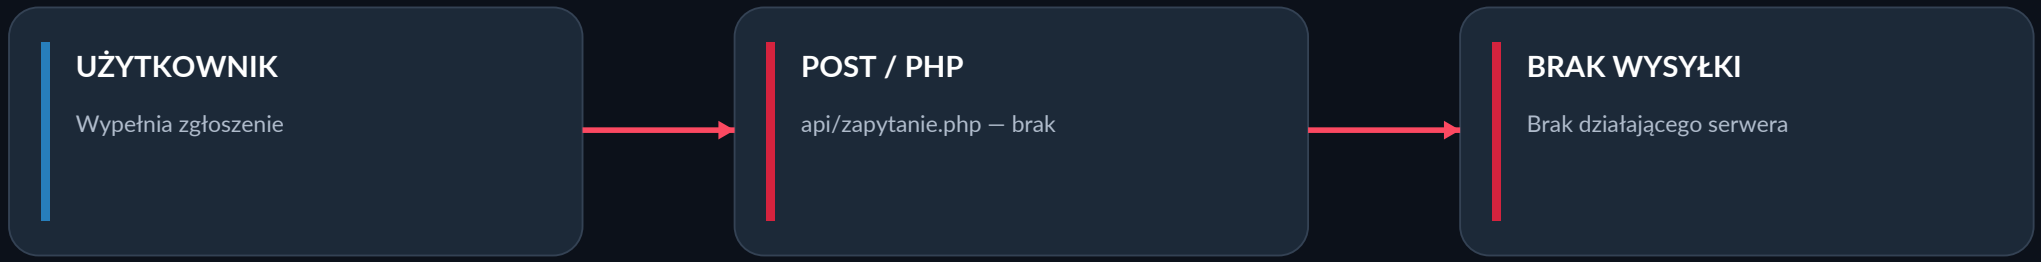

PLAN W DWÓCH FAZACH

FAZA A / PREVIEW

Mailto + kopia danych

Czytelnie przekazać, że wysyłkę kończy klient w swoim programie pocztowym. Zapewnić alternatywę kopiowania.

FAZA B / PRODUKCJA

Backend + SMTP

Serwerowa walidacja, ochrona antyspamowa, limity żądań, monitoring, potwierdzenie i zgodność z wymogami prywatności.

Reguła zaufania: komunikat „wysłano” dopiero po rzeczywistym potwierdzeniu serwera.

10 / ŚCIEŻKA KLIENTA

Od wyboru oferty do potwierdzenia

Zaprojektować przepływ, w którym wybór pakietu jest zachowany, dane są jawnie weryfikowane, a status wysyłki jednoznaczny.

DOCELOWY PROCES / BEZ UTRATY KONTEKSTU

01
OFERTA
LAN / FIBER / AIR

→

02
WYBÓR
Pakiet + czas umowy

→

03
ADRES
Punkt instalacji

→

04
ZGŁOSZENIE
Podsumowanie danych

→

05
POTWIERDZENIE
Tylko realne ACK

WIDOK PODSUMOWANIA / KONCEPCJA FUNKCJONALNA

Pakiet: FIBER 100

Umowa: 2 lata

Miejsce instalacji: adres klienta

STATUS PO WYSŁANIU

Przyjęto zgłoszenie

Tylko jeśli backend zwróci sukces. W preview: informacja o otwarciu poczty.


WYMAGA REALNEGO BACKENDU DLA STATUSU „PRZYJĘTO”

11 / GEOLOKALIZACJA

Mapa, adres i prywatność

Leaflet i OpenStreetMap wspierają wybór lokalizacji, lecz geokodowanie przez Nominatim przekazuje adres do zewnętrznej usługi.

ZALEŻNOŚCI DANYCH / ŚWIADOMY PRZEPŁYW

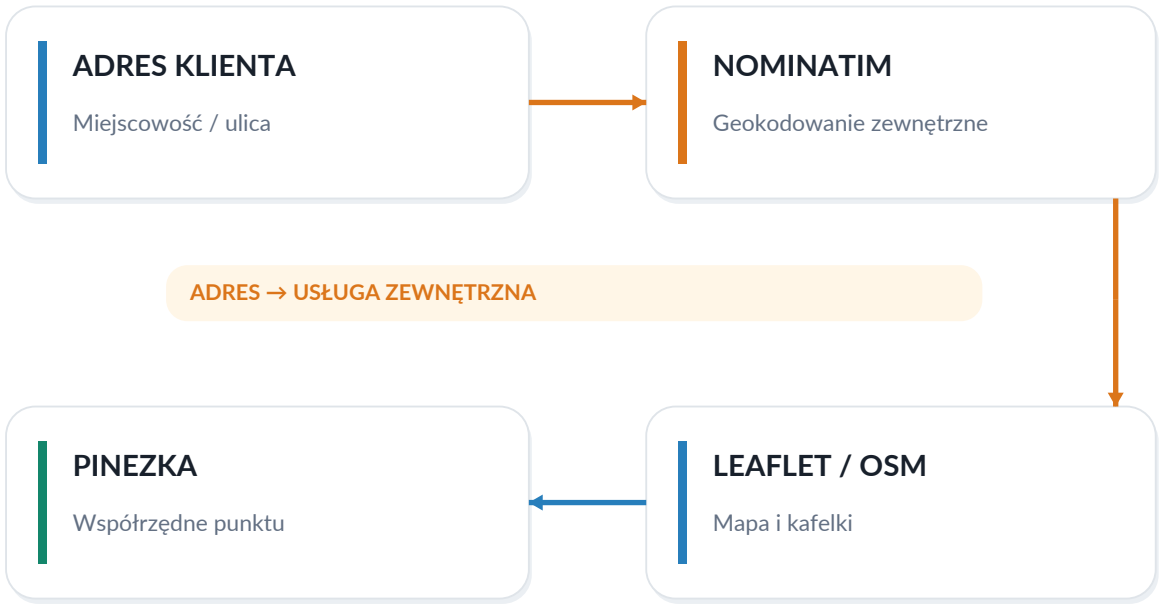

KONTROLA RYZYK

- **Geokodowanie**
  Wywołanie po świadomej akcji
- **Limit API**
  Respektować zasady Nominatim
- **Pinezka**
  Ustabilizować drag-test V21
- **Fallback**
  Możliwość podania adresu
- **Prywatność**
  Opisać przekazywanie danych


Uwaga: wynik testu przeciągania pinezki bywa niestabilny — wymagana deterministyczna regresja.

12 / UX MOBILNY


Mniej tarcia na małym ekranie

Nawigacja dostępna także poniżej 900 px; po wyborze oferty klient ma zawsze widzieć kontekst i prosty krok do kontaktu.

OBECNA KONCEPCJA

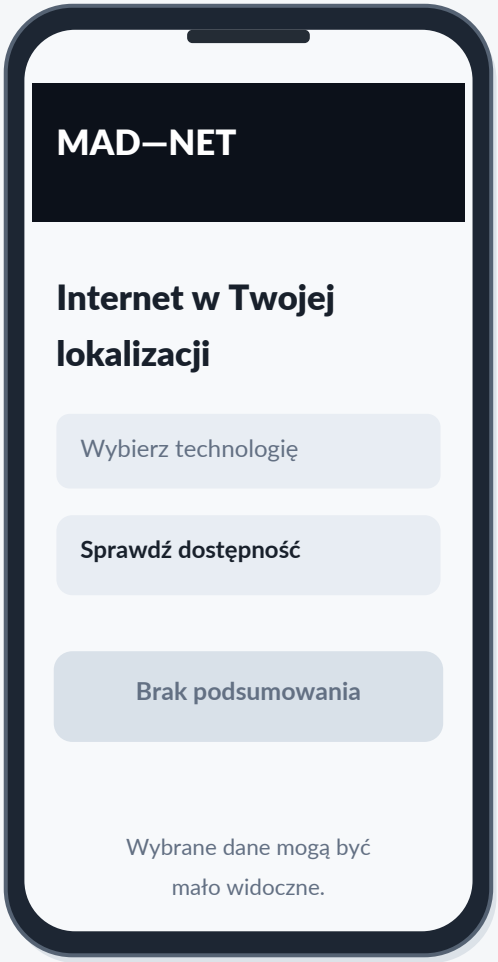

KIERUNEK ROZWOJU

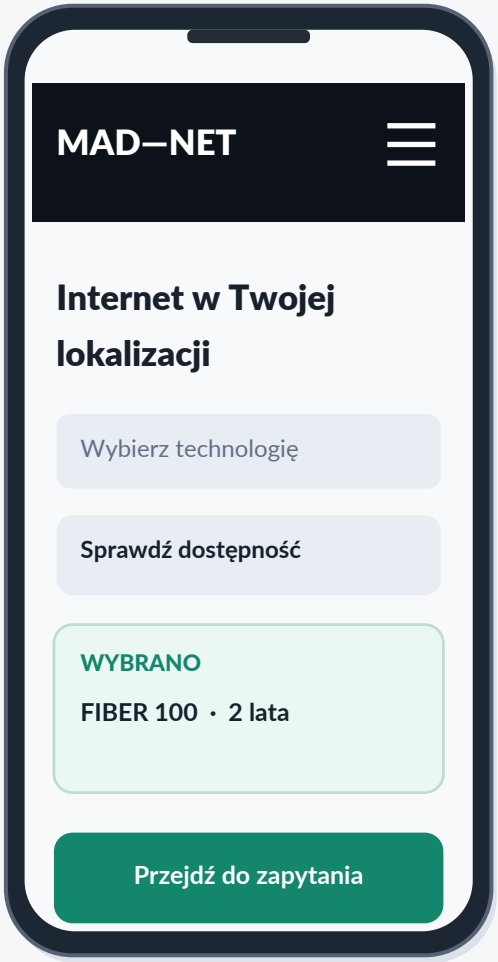

CHECKLIST / MOBILE

MENU
Dostęp do sekcji na <900 px

KONTEKST
Wybrany pakiet nie znika

UMOWA
1 rok / 2 lata / bezterminowo

GESTY
Scroll nie podłącza kabla

DOSTĘPNOŚĆ
Focus, 200% zoom i czytelność

13 / JAKOŚĆ

Matryca testów i dostępności

Skuteczny redesign nie jest potrzebny. Potrzebne są stałe kontrole geometrii, stanów UI i rzeczywistych interakcji.

WERYFIKACJA SZEROKOŚCI / KAŻDA MA INNY PROFIL RYZYKA

360 px

Wąski telefon

Panel AIR, CTA

390 px

Telefon typowy

Karty i porty

768 px

Tablet

Nawigacja i siatka

1440 px

Desktop

Routing i skala

REGRESJA / MATRYCA ZACHOWAŃ

OBSZAR	MYSZ / KLAWIATURA	DOTYK / MOBILE	REDUCED MOTION
RACK	Hover i focus	Brak przypadkowego hover	Brak agresywnych pulsu
PRZEWODY	Routing bez kolizji	Tap ≠ scroll ≠ hold	Wyłączenie animacji
FORMULARZ	Walidacja i komunikat	Przewijalność, klawiatura	Bez blokad i ruchu

14 / TREŚCI I SEO

Z demonstracji w wiarygodną ofertę

Rozbudować strukturę informacji o lokalność, proces instalacji, parametry ofert i zaufanie — bez dopisywania niezweryfikowanych obietnic.

MAPA TREŚCI / REKOMENDACJA IA



FILARY KOMUNIKACJI / DO POTWIERDZENIA Z OPERATOREM

- **OBSZAR** — Trzebiatów, Mrzeżyno i okolice
- **INSTALACJA** — Jak wygląda realizacja przyłącza
- **SERWIS** — Szybki kontakt z lokalnym zespołem
- **USŁUGI** — Internet, monitoring, alarmy, WWW

15 / ARCHITEKTURA

Refaktor w granicach rozsądku

Nie migrować na nowy framework bez dowodów. Najpierw ustabilizować testy, później wydzielać dane i odpowiedzialności małymi krokami.

DZISIAJ / ODPOWIEDZIALNOŚCI SKUPIONE

cennik.js

~575 linii / dane + DOM + kable

dostepnosc.js

~260 linii / formularz + mapa

styles.css

~127 KB / rozbudowana kaskada

STOPNIOWO / CZYTELNE GRANICE

OFERTY / DANE

Jeden kontrakt pakietów

CENNIK / ROUTING

Widok odseparowany od geometrii

FORMULARZ / MAPA

Zależności testowane niezależnie


Warunek: przed i po każdej ekstrakcji ten sam zestaw regresji V20 / V21 / PCB + review wizualny.

16 / WYDAJNOŚĆ

Optymalizacja oparta na pomiarach

Rozmiar wszystkich plików repozytorium nie jest tożsamy z transferem pojedynczej wizyty. Część kategorii zawiera się w innych.

WIELKOŚĆ ZASOBÓW / STAN REPOZYTORIUM

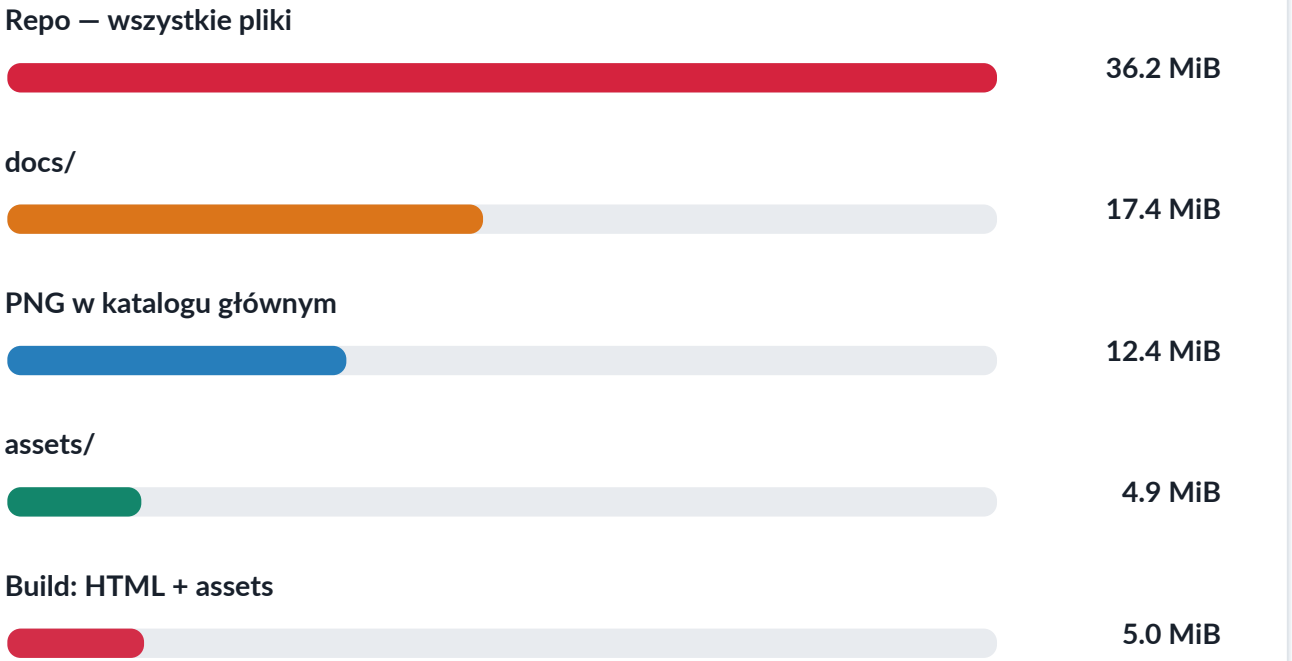

METRYKI DO ZMIERZENIA

01 CWV
LCP / CLS / INP

02 Lighthouse
Mobile i desktop

03 MEDIA
RACK / SVG / obrazy

04 TRANSFER
Żądania sieciowe

05 RETEST
Słabszy smartfon

Podział jest opisowy: nie sumować kategorii, nie traktować ich jako bieżącego kosztu transferu.

17 / PRIORYTETY

Macierz wpływu i nakładu

Szacunek jakościowy na podstawie zidentyfikowanych ryzyk — to nie kosztorys ani rezultat pomiaru projektowego.

WYSOKI WPŁYW

NISKIE NAKŁADY ← → WYŻSZE NAKŁADY

NISKI NAKŁAD / WYSOKI WPŁYW

Stabilizacja CI • AIR 360 px

Menu mobilne / spójne etykiety

WYŻSZY NAKŁAD / WYSOKI WPŁYW

Backend SMTP i obsługa leadów

Kontrola publikacji produkcyjnej

NISKI NAKŁAD / NIŻSZY WPŁYW

Porządek w dokumentacji

Optymalizacja metadanych

WYŻSZY NAKŁAD / NIŻSZY WPŁYW

Kolejne efekty wizualne


Pełny redesign HERO

Priorytet: P0 → P1 → P2. Nie inwestować w nowy HERO, dopóki ścieżka klienta ma blokery.

18 / KOLEJNOŚĆ

Roadmapa: sześć etapów wdrożenia

To mapa zależności, nie kalendarz. Każdy etap musi zakończyć się sprawdzalnym dowodem jakości i zaakceptowanym zakresem.

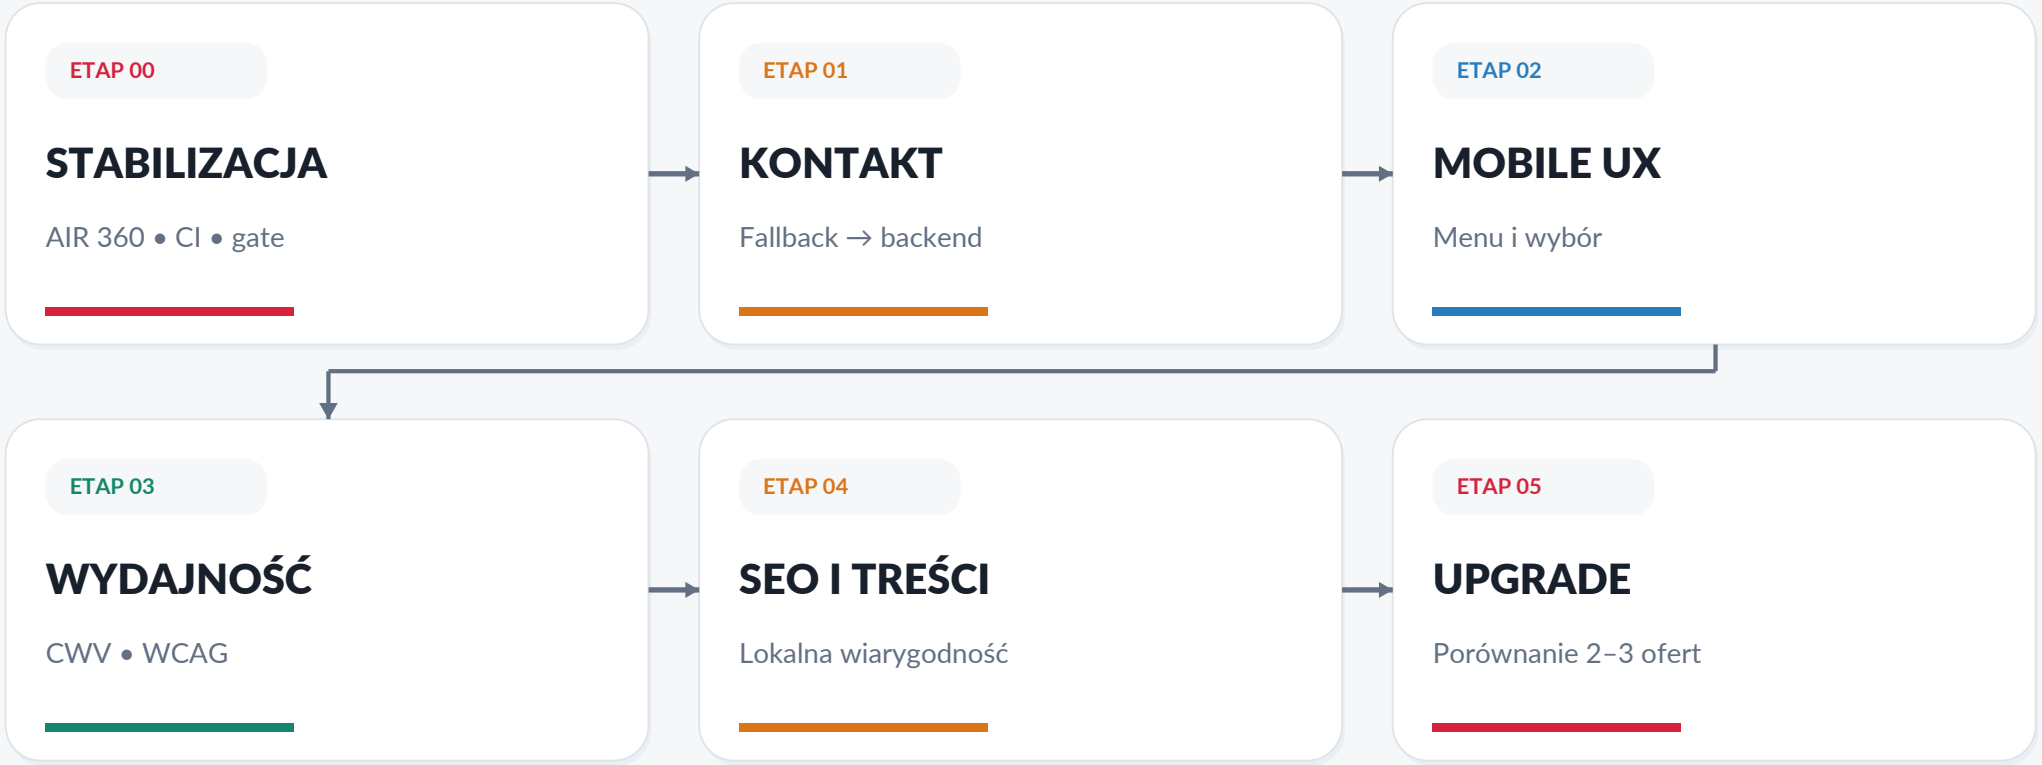

QUALITY GATES → CI PASS / kontakt działa / brak regresji / zatwierdzone dane ofertowe

19 / KONTROLA

Definition of Done dla Codexa

Dowieźć poprawkę oznacza: mieć zmianę w kodzie, test, czytelny dowód, commit i weryfikację skutku w działającej wersji.

ETAP	CEL	KRYTERIUM ODBIORU	DOWÓD
0	CI / AIR	Brak nakładania się treści AIR przy 360 px	Chromium + GitHub Actions
1	FORMULARZ	Kontakt działa, bez fikcyjnego komunikatu sukcesu	E2E + próba realnego maila
2	MOBILE	Tap, scroll, menu, klawiatura, 200% zoom	360 / 390 / 768 / 1440 px
3	JAKOŚĆ	Pomiary przed / po; brak regresji	CWV, Lighthouse, WCAG
4	TREŚCI	Zatwierdzone informacje i lokalizacje	Review operatora MAD-NET
5	UPGRADE	Porównanie 2–3 ofert bez przekłamań	E2E + review UX

Proces: git diff --check • testy • build • screenshot QA • commit • push • review

20 / WNIOSKI KOŃCOWE

Zachować design. Zbudować zaufanie.

Strona jest wizualnie dojrzała. Kolejny poziom MAD-NET to niezawodna obsługa zapytań, proces publikacji oparty na testach oraz lokalna wiarygodność.

NAJBLIŻSZA DECYZJA / BEZ UZNANIOWYCH EKSPERYMENTÓW

ETAP 00 → ETAP 01

1. Przywrócić pełne PASS w CI. 2. Naprawić układ AIR przy 360 px. 3. Usunąć pozorną wysyłkę formularza. 4. Dopiero potem rozszerzać UX, SEO i funkcje.

PODSTAWA OPRACOWANIA / STAN REFERENCYJNY

- Repozytorium: github.com/kapi1944/MAD-NET / main, commit 99b71d2 / 31.10.2026.
- Kod: index.html, cennik.js, dostepnosc.js, hero-rack.js, styles.css, testy V20/V21/PCB.
- Dowód CI: GitHub Actions, workflow run 41204609545; nieudany test 360 px AIR.
- Historia zmian Codexa: ca392bb, 15c5d10, 533005b, 56e96d9, 776b106, 2c10706, f724536.
- Ilustracje urządzeń i mockupy: wizualizacje poglądowe, nie screenshoty aktualnej strony.

Zakres: analiza kodu i logów; bez niezależnych pomiarów terenowych, testów na fizycznym urządzeniu i uruchomionego backendu.
